
신제품 개발 6단계

테슬라 모델 3 사례



고채현 · 박민준

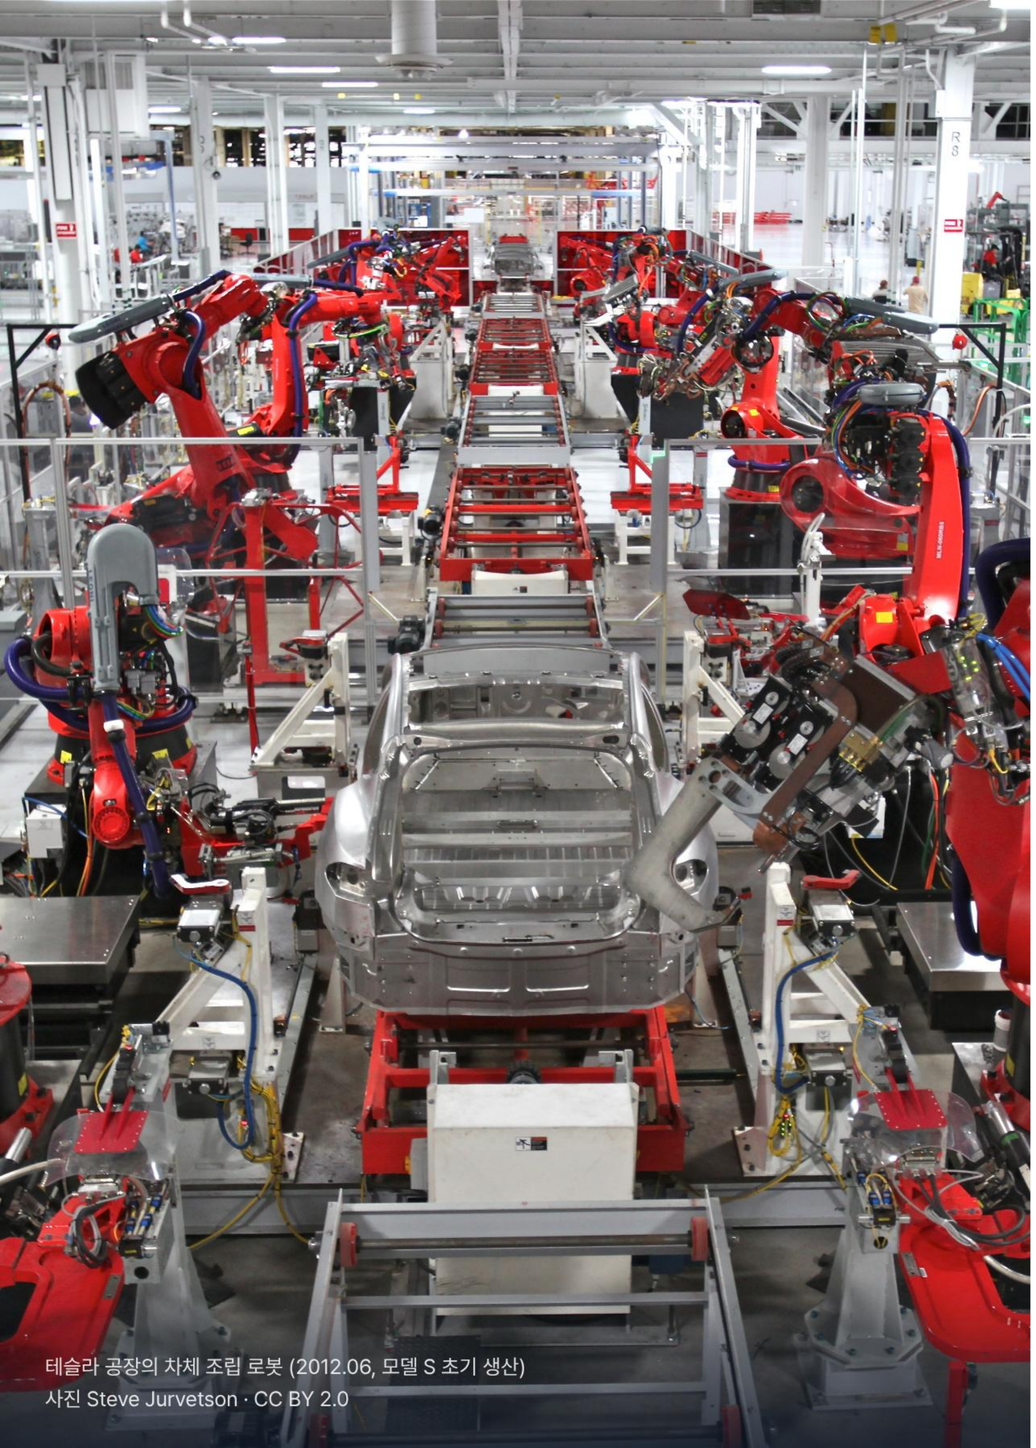

테슬라 공장의 차체 조립 로봇 (2012.06, 모델 S 초기 생산)
사진 Steve Jurvetson · CC BY 2.0

02 목차

발표 구성

중심 내용

1 **강의자료의 신제품 개발 6단계** — 3~6장
개념 정립부터 대량 생산까지

6단계를 이해하기 위한 사례

2 **테슬라 모델 3 사례 적용** — 7~8장
공개 자료의 사실을 6단계에 대응

결론

3 **핵심 정리** — 9장
토론 문제에 대한 답

아이디어에서 제품까지, 여섯 단계

1 2 방향과 설계
3 4 제품·공정 검증
5 6 도입과 안정화

방향과 설계 (①②)

1 개념 정립
상품기획

→

2 제품 설계
제품기획 · 기본설계

제품·공정 검증 (③④)

→

3 제품 엔지니어링
양산설계 I · II

→

4 공정 엔지니어링
생산준비

도입과 안정화 (⑤⑥)

→

5 시장진출 준비
영업준비

→

6 대량 생산
생산/영업

※ 세 구간의 이름은 강의자료의 단계명이 아니라, 이해를 돕기 위해 발표자가 붙인 묶음입니다. 단계명·핵심 활동은 강의자료 그대로입니다.

→ 아이디어가 여섯 단계를 거쳐 생산·판매되는 제품이 된다

①은 제품 개념을, ②는 설계안·목표 스펙을 정한다

1 1단계 개념 정립

고객 니즈에 맞는 제품 개념을 정한다

상품기획

개발상품의 니즈에 적합한 신제품의 **개념**을 설정

2 2단계 제품 설계

설계안·목표 스펙과 기본 기능을 정한다

제품기획

최적 설계안 선정과 **목표 스펙** 결정

기본설계

외관, 디자인을 포함한 시스템 수준의 일차적 기능 설계

③은 설계 품질, ④는 제조품질

3 3단계 제품 엔지니어링

설계 품질을 확보한다

양산설계 I

상세 설계 및 **설계 품질** 확보

양산설계 II

기능·성능·신뢰성 개선 및 양산성 향상

4 4단계 공정 엔지니어링

제조품질을 확립한다

생산준비

양산 라인에의 시험생산을 통한 **제조품질** 확립

⑤는 영업 준비, ⑥은 생산·영업 체제 안정화

5 5단계 시장진출 준비

시장 도입 개시에 앞서 영업을 준비한다

영업준비

시장 도입 개시에 필요한 영업 준비

6 6단계 대량 생산

생산·영업 체제를 확립하고 안정화한다

생산 / 영업

생산, 영업 체제의 **조기 확립과 안정화**

모델 3의 공개·설계·시험



2016.03.31 모델 3 공개 행사
사진 Steve Jurvetson · CC BY 2.0

→ ①~③은 제품 자체를 정하고 다듬는 활동으로 볼 수 있다 (발표자 적용)

1 개념 정립 — 2016년 1분기 공개

확인된 사실: 대중 시장용, 더 낮은 가격의 세단으로 공개

6단계 적용: **공개로 제품 개념을 확인 (개념 정립 시점은 아님)**

2 제품 설계 — 2016년 2분기 서한

확인된 사실: 디자인 단계 완료, 금형·생산 계획·검증으로 이행

6단계 적용: **제품 설계 사례 (설계안 선정·목표 스펙 결정은 미확인)**

3 제품 엔지니어링 — 2017년 1분기

확인된 사실: 출시 후보 차량 점검, 도로 시험으로 주행 특성·내구성 확인

6단계 적용: **제품의 성능·내구성을 다듬는 활동**

Tesla 10-Q (2017년 1분기) · Tesla 2016년 2분기 주주서한 (8-K, 2016.08.03)

모델 3의 공정 준비·출시·생산 안정화



2017.07.28 모델 3 첫 인도 행사 현장
사진 Steve Jurvetson · CC BY 2.0

→ ⑤와 ⑥의 활동은 2017년 7월부터 시기가 겹친다 (발표자 적용)

④ 공정 엔지니어링 — 자료 확인: 2016년 2분기·2017년 1분기

확인된 사실	프레스·도장 초기 설비 가동, 생산 시설·공급업체 준비
6단계 적용	공정 준비는 확인 · 시험생산을 통한 제조품질 확립은 미확인

⑤ 시장진출 준비 — 2017년 7월 말 ~ 8월

확인된 사실	예약한 직원부터 주문 시작, 일반 예약자는 차례로 주문 초대 예정
6단계 적용	영업 준비 · ⑥ 초기 생산·첫 인도와 시기 겹침 (예약 ≠ 확정 주문)

⑥ 대량 생산 — 2017년 7월 → 2018년 3분기

확인된 사실	초기 생산·첫 인도 → 생산량 확대 → 2018년 3분기 생산 시스템 안정화
6단계 적용	생산 체제 안정화의 근거 (영업·인도 체제 안정까지는 단정 안 함)

개념에서 양산 안정화까지, 여섯 단계



신제품 개발 절차는 제품의 개념과 설계를 정하고(①②), 제품과 생산 공정의 품질을 확보한 뒤(③④), 영업을 준비해 생산·영업 체제를 안정화하는(⑤⑥) 과정이다.

10 출처

교수님 강의자료와 테슬라 공식 자료

교수님 강의자료

「제5강 경영프로젝트의 개발」

슬라이드 35: 「신제품 개발 단계와 단계별 핵심 활동」

6단계의 명칭·활동·목적

슬라이드 65: 「토론」 4번

"신제품 개발 절차를 간략하게 제시하여라."

테슬라 공식 자료

2016년 2분기 주주서한 ↗

모델 3 디자인 단계 완료·생산 설비 준비

2017년 1분기 Form 10-Q ↗

출시 후보 차량 시험·생산 준비

2017년 2분기 주주서한 ↗

초기 생산·첫 인도·주문 절차

2018년 3분기 Update ↗

생산 시스템 안정화

ⓘ **모델 3의 공개 사실을 강의자료의 6단계에 연결한 부분은 발표자의 해석입니다.**

사진 출처: 1장 Unsplash (Unsplash 라이선스) · 2·7·8장 Steve Jurvetson (Wikimedia Commons, CC BY 2.0)

감사합니다
